Comprobante

Número de comprobante:	**2057-2059**
Servicio:	**Sistema de Bombas Contra Incendio - Bomba Jockey - Tableros**
Proveedor:	**ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.**
Fecha de emisión:	**13-04-26**
Fecha de vencimiento:	**15-04-26**
Comentarios:	**40% DE CAMBIO PARCIAL DE MANIFOLD - TORRE C**
Adjunto:	**Si**

Pago

Folio	Número de operación	Fecha de pago	Monto pagado	Comentario	Adjunto
14	116865	15/04/2026	2,893.00	40% DE CAMBIO PARCIAL DE MANIFOLD - TORRE C	Si

Asistencias Blue Hogar

Sede Lima.

COTIZACIÓN 2057-2059

RUC 20612188832- Juan Valer Sandoval 660, Piso 3 - Pueblo Libre
Ciudad: Lima
Celular: 989222265
Teléfono: (01)6085645
E-mail: contacto@asistenciasblue.com
Asesor de venta: Karla Castro.

FECHA	13/04/2026
COTIZACIÓN #	02059
CLIENTE ID	LM 147
VALIDO HASTA	30/04/2026

Señores: Edificio Paseo del Parque
Junta de copropietarios
Dirección: chorrillos

CUARTO DE BOMBAS 1
DESPIECE MANIFOLD TORRE "C"

ITEM	CANT		DESCRIPCION
01	9	UND	ACOPLE DE 2 ½ RANURADO
02	3	UND	CODO DE 4" X 45° RANURADO
03	6	UND	NIPLE DE 4 X10" RANURA- ROSCA ACERO INOX
04	3	UND	TE MECANICA DE 4 A 21/2 ROSCA
05	6	UND	NIPLE DE 21/2 X 2" ACERO INOXIDABLE
06	3	UND	BRIDA DE 2 1/2 ROSCA ACERO INOXIDABLE
07	3	UND	VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2 PALETA ACERO INOXIDABLE
08	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 10 CM ROSCA - RANURA ACERO INOXIDABLE
09	3	UND	ACOPLE DE 21/2
10	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 20 CM ROSCA - RANURA ACERO INOX
11	9	UND	BRIDA DE 21/2 ROSCA ACERO INOXIDABLE
12	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 10 CM ROSCA - RANURA ACERO INOXIDABLE
13	3	UND	CODO DE 2 1/2 RANURADO
14	3	UND	ACOPLE DE 21/2
15	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 15 CM ROSCA - RANURA ACERO INOXIDABLE

16	4	UND	CHECK RESORTE ACERO INOXIDABLE DE 2 1/2 ACERO
17	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 15 CM ROSCA - RANURA ACERO INOXIDABLE
18	3	UND	ACOPLE DE 21/2
19	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 20 CM ROSCA - RANURA ACERO INOXIDABLE
20	3	UND	VALVULA MARIPOSA DE 21/2 PALETA ACERO INOX
21	6	UND	BRIDA PARTIDAN DE 2 1/2 RANURADO
23	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 3" RANURA Y RANURA ACERO INOX
24	3	UND	NIPLE DE 4 X 1.66 CM ACERO INOXIDABLE
25	3	UND	TE MECANICA DE 4 A 3" RANURADO

26	3	UND	ACOPLE DE 3" RANURADO
27	1	UND	VALVULA MARIPOSA DE 3" PALETA ACERO INOX
28	3	UND	BRIDA DE 3" ROSCA ACERO INOXIDABLE
29	1	UND	TE MECANICA DE 3 A 1 ROSCA
30	3	UND	BUSHING DE 1 A 1/4 ACERO INOX
31	2	UND	NIPLE DE 1/4 X 2" ACERO INOX
32	1	UND	VALVULA DE PASO DE 1/4 ACERO INOX
33	3	UND	NIPLE DE 1/4 X 2" ACERO INOX



DESCRIPCIÓN TÉCNICA – CAMBIO DE MANIFOLD EN ACERO INOXIDABLE 316 Y REINGENIERIA EN SU DISEÑO

1. **ALCANCE DEL SERVICIO**
2. El presente servicio comprende el retiro del sistema de manifold existente y la implementación de un nuevo sistema hidráulico en acero inoxidable grado 316, incluyendo líneas de succión (carga) y descarga del sistema de presión constante, desde su conexión en tanque cisterna hasta el sistema de bombeo.

El nuevo diseño contempla conexiones tipo brida de presión, con el objetivo de facilitar futuros trabajos de mantenimiento, desmontaje y limpieza del sistema.

2. TRABAJOS PRELIMINARES
Coordinación para corte programado del servicio de agua
Aislamiento hidráulico del sistema
Drenado de líneas existentes
Señalización y control del área de trabajo
TIEMPO DE EJECUCION: 2 DIAS

3. RETIRO DE SISTEMA PARCIAL EXISTENTE
Se ejecuta el desmontaje del manifold actual, incluyendo:
Retiro de niplería y accesorios en succión y descarga
Desconexión de válvulas y conexiones

4. FABRICACIÓN DEL NUEVO SECTOR DE DESCARGA.

Sistema de descarga PARCIAL:
Colector principal de impulsión
Válvulas check por cada bomba
Válvula check en la niplería de descarga final hacia los departamentos
Válvulas de aislamiento

5. SISTEMA DE CONEXIÓN – BRIDAS DE PRESIÓN

El nuevo sistema incorpora conexiones tipo brida, lo que permite:
Desmontaje rápido sin necesidad de corte
Facilitar mantenimiento correctivo y preventivo
Limpieza interna del sistema
Reducción de tiempos de intervención

6. INSTALACIÓN DEL SISTEMA
Montaje del manifold de succión en acero inoxidable 316
Instalación del manifold de descarga
Alineación hidráulica de las bombas
Ajuste de bridas, pernos y empaques
Sellado y verificación de uniones

7. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
Prueba de hermeticidad en conexiones bridadas
Presurización del sistema
Verificación de fugas
Prueba operativa del sistema de bombeo
Validación de presión de trabajo
8. RESULTADO FINAL
Sistema hidráulico renovado con material anticorrosivo
Eliminación de fugas y uniones deterioradas
Mejora en la estabilidad de presión

Sistema preparado para mantenimiento eficiente
9. VENTAJAS TÉCNICAS DEL SISTEMA IMPLEMENTADO

✓ Mayor vida útil del sistema (acero inoxidable 316)
✓ Alta resistencia a corrosión y agua potable
✓ Reducción de fallas por oxidación
✓ Facilidad de mantenimiento (sistema bridad o desmontable)
✓ Mejora en confiabilidad operativa
Imagen real:

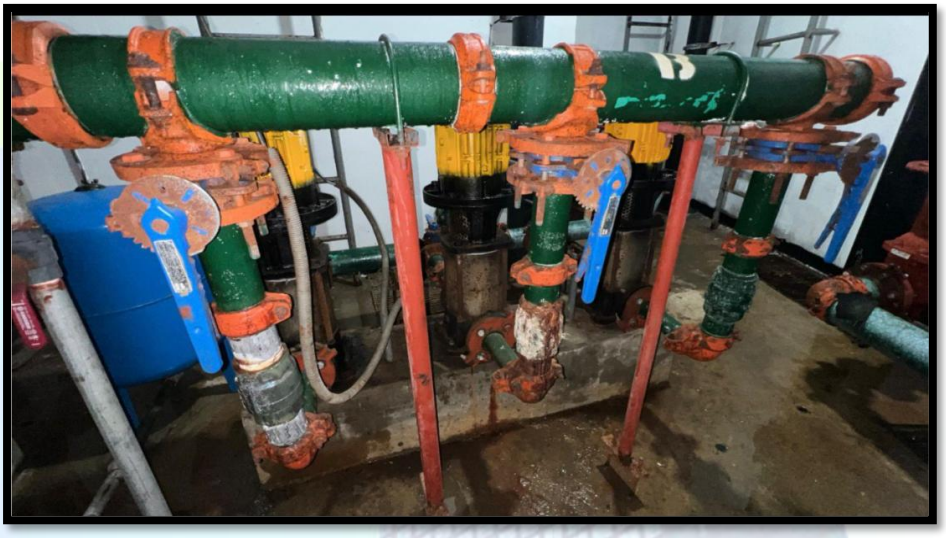


imagen referencia creada con IA (algunos accesorios pueden cambiar de color, como lo son los pedestales de apoyo)



10.PROPUESTA ECONÓMICA:

VALOR TOTAL DEL PROYECTO S/.7.108.00
Este valor no incluye igv.

Asistencias Blue S.A.C.
www.asistenciasblue.com

11. CONSIDERACIÓN TÉCNICA FINAL

La implementación de un manifold en acero inoxidable 316 con conexiones bridadas representa una mejora sustancial en la infraestructura hidráulica del sistema, permitiendo optimizar la operación, reducir costos de mantenimiento a largo plazo y garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el manejo de agua potable.
se dará inicio a un periodo de marcha blanca de 10 días calendario, se recomienda el cambio total del manifold comprendiendo el sector de succión y descarga.
Durante este periodo se ejecutarán pruebas de funcionamiento, ajustes finos y monitoreo continuo, con la finalidad de verificar la correcta operatividad de los equipos y garantizar la estabilidad del sistema intervenido.
Cualquier observación o incidencia detectada será atendida de manera inmediata dentro de este plazo, como parte del proceso de optimización del servicio.

0.ACLARACIÓN DE GARANTÍA – SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE

En relación a los trabajos ejecutados correspondientes al **cambio parcial del manifold en el sistema de descarga de las 03 bombas de presión constante**, se deja constancia de lo siguiente:
El alcance del servicio comprendió **únicamente la intervención del tramo del manifold desde la salida directa de las electrobombas**, sin incluir la renovación total del sistema hidráulico ni la sustitución de la totalidad de la niplería existente.
Debido a que el sistema mantiene **tramos antiguos de tubería y accesorios (niplería)** en condiciones de desgaste, incrustaciones y **calcificación interna**, no es posible garantizar la integridad ni el comportamiento hidráulico del sistema en su totalidad.
Asimismo, al tratarse de un sistema de presión constante, este opera bajo condiciones variables de presión, pudiendo generarse:

- **Sobrepresiones puntuales** en la red.
- **Desprendimiento de incrustaciones internas** provenientes de la tubería antigua.
- **Obstrucciones o golpes de presión**.
- **Fugas o roturas en puntos no intervenidos**.

Por lo expuesto, se establece que:
NO APLICA GARANTÍA sobre el sistema completo, debido a que el trabajo ejecutado fue de carácter parcial y no integral.
La garantía, en caso corresponda, se limita exclusivamente a:

- El tramo de manifold intervenido.
- La correcta instalación de los componentes nuevos.

Sin embargo, no cubre:

- Fallas en tramos antiguos.
- Daños derivados de sobrepresión.
- Obstrucciones por desprendimiento de calcificación.
- Colapsos del sistema por condiciones preexistentes.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA

Se recomienda realizar la **renovación integral del sistema de descarga (manifold y niplería completa)** en materiales adecuados (acero inoxidable o equivalente), con el fin de:

- Garantizar estabilidad hidráulica.
- Evitar fallas estructurales.
- Permitir una operación segura del sistema de presión constante.

NOTA FINAL

La continuidad operativa del sistema bajo las condiciones actuales queda **bajo responsabilidad del cliente**, al no haberse ejecutado una intervención integral conforme a las recomendaciones técnicas emitidas.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La validez de la garantía estará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. **Ejecución de mantenimiento preventivo periódico del sistema hidráulico**, incluyendo revisión de:
    - Válvulas
    - Conexiones bridadas
    - Presión de operación
2. **Limpieza y desinfección de cisternas cada seis (06) meses**, conforme a normativa sanitaria vigente.
3. Operación del sistema dentro de los parámetros normales de diseño hidráulico.
4. No intervención de terceros no autorizados en el sistema.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

La garantía quedará sin efecto en los siguientes casos:

- Falta de mantenimiento preventivo periódico
- No realización de la limpieza semestral de cisternas
- Acumulación de sedimentos o material sólido en el sistema
- Manipulación indebida o modificaciones no autorizadas
- Daños por factores externos (golpes, sobrepresión, fenómenos naturales, etc.)

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre:

- Defectos de fabricación del manifold en acero inoxidable
- Fallas en uniones bridadas por defectos de instalación
- Problemas de hermeticidad atribuibles al montaje

No incluye:

- Desgaste normal de válvulas o accesorios
- Componentes externos al sistema instalado
- Fallas derivadas del sistema existente del edificio

RECOMENDACIÓN TÉCNICA

Se recomienda que los mantenimientos preventivos sean ejecutados por **Asistencias Blue Hogar S.A.C.**, a fin de garantizar la continuidad de la garantía y la correcta operación del sistema.

CORDIALMENTE:

ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.
RUC: 20612188832

Hugo Dominguez A.
Rep. Para el Perú.

Sede Perú: Juan valer Sandoval 660 pueblo libre-lima, Perú. Tel Wspp-(+51) 910463731
Sede Republica Dominicana: av Italia 1 palma cana 3b sector White sands-Bavaro, Punta Cana tel -Wspp: (+1)8493154227
Visita nuestra página www.asistenciasblue.com

BCP

TRANSFERENCIA A TERCEROS BCP

Monto transferido

S/ 2,893.00

Martes, 14 abril 2026 - 10:45 p. m.

Enviar a	**Asistencias Blue Hogar S.a.c.** **** 8097 Moneda soles
Banco destino	**BCP**
Desde	**CUENTA CORRIENTE** **** 3015
Canal	**Banca por internet BCP**
Número de operación	**06116865**
