# Comprobante

**Número de comprobante:** **2026026**
**Servicio:** **Pozos a Tierra**
**Proveedor:**
**Fecha de emisión:** **30-04-26**
**Fecha de vencimiento:** **30-04-26**
**Comentarios:**
**Adjunto:** **Si**

# Pago

| Folio | Número de operación | Fecha de pago | Monto pagado | Comentario | Adjunto |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210384 | 30/04/2026 | 1,911.60 | 60% ADEL. MANTEN. POZOS A TIERRA | Si |

RSOLUCIONES TECNOLOGICAS E INFRAESTRUCTURA E.I.R.L.

# RSoluciones Tecnológicas e Infraestructura E.I.R.L.

Implementación nuevas tecnologías para brindar mejores experiencias
Implementación y mantenimiento sistemas de cámaras de video vigilancia
Implementación y mantenimiento sistemas eléctricos y pozos de tierra
Implementación y mantenimiento sistema DACI

| COTIZACION |
|---|
| 2026026 |

De nuestra mayor consideración, atendiendo su solicitud estamos enviando cotización de los servicios mencionados.

**Proyecto :** **Mantenimiento Preventivo en (10) Pozos de puesta a Tierra**

**Referencia :** **Altura Colegio Innova School Chorrillos Universo 2**

| POLIZA | CLIENTE | CONTACTO | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|
| | Junta De Propietarios | Sra. Norda Rengifo | 24-Abr-2026 | Lima |
| **NUMERO** | **DIRECCION** | **E-MAIL** | **TELEFONO** | **T. PAGO** |
| | Jr. Universo 291, Urb. La Campiña, Chorrillos | | 943 987 062 | A CONVENIR |

| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (10) POZOS DE PUESTA A TIERRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **VR. UNITARIO** | **VR. TOTAL** |
| 1.01 | | El servicio incluye materiales y mano de obra:<br>1.- Transporte de materiales y herramientas.<br>2.- Medición de resistividad de puesta a tierra con telurómetro digital, antes y después del servicio de mantenimiento.<br>3.- Excavación del pozo a 80 cms y tratamiento del terreno con **(01) Dosis de Thor Gel Industrial**, con ficha técnica, prueba de operatividad y hoja de seguridad.<br>4.- Cambio de conectores de cobre A/B y lijado especial de la barra de cobre o electrodo y parte del cable de aterramiento.<br>5.- Copia certificada de calibración del equipo medidor (Telurómetro).<br>6.- Protocolo de medición de los pozos de tierra, firmado por Ingeniero colegiado habilitado.<br>7.- Pintado y rotulado de la caja de registro, con pintura esmalte y thinner acrílico.<br>8.- Señalización de acuerdo a la NTP.<br>9.- Informe técnico de trabajos realizados, con fotos, observaciones y/o sugerencias. | 10 | UND | S/. 300.00 | S/. 3,000.00 |

| CONDICIONES COMERCIALES | | | |
|---|---|---|---|
| 1.- Los precios están considerados en nuevos soles. | **GRAN TOTAL** | S/. | 3,000.00 |
| 2.- La garantía por el servicio es de (12) meses. | **DCTO 10%** | **S/.** | **300.00** |
| 3.- La aceptación del servicio es: 60% de adelanto y 40% al final del servicio. | | S/. | 2,700.00 |
| 4.- La validéz de la oferta es por 15 días. | **I.G.V. 18%** | S/. | 486.00 |
| | **VALOR TOTAL** | S/. | 3,186.00 |

**NOTA**

NO incluye el reemplazo de repuestos y/o accesorios que no sean descritos en la descripción del servicio.
NO se incluye el reemplazo del cable de aterramiento hasta el tablero eléctrico.
El plazo de entrega será de (02) días una vez recibida la orden del servicio.
**Se realizará una inspección técnica a los (06) meses de realizado el servicio.**

**SEGURIDAD**

El personal técnico cuenta con uniforme y con EPP (zapatos, guantes, lentes y respiradores de polvo).
El personal técnico cuenta con equipos de Bioseguridad (alcohol, mascarillas, protector facial y mamelucos).

**JR. PRESBITERO GARCIA VILLON 671 - CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA**
**E-MAIL: RSOLUCIONESTECNOLOGICAS@GMAIL.COM / WHATSAPP: 943 834 656**

## IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS POZOS DE TIERRA


1.- El sistema de puesta a tierra es un mecanismo de seguridad de tipo eléctrico, el cual sirve para derivar las descargas eléctricas hacia la TIERRA y con el cual se evita que la persona humana entre en contacto con dicha descarga.

2.- Es un sistema que asegura que ante cualquier falla de aislamiento, las partes metálicas de todo equipo eléctrico descarguen la corriente eléctrica a tierra, sin afectar al usuario o al dispositivo que entre en contacto con el equipo eléctrico, evitando así que sufra una descarga eléctrica que afecte a la salud física.

3.- En Perú, la resistencia de un Pozo a Tierra no debe superar los 25 ohmios, según el Código Nacional de Electricidad. Sin embargo, para algunas instalaciones específicas, tales como centro de Datos o salas de control, se pueden requerir valores de resistencia menores.

4.- Para Telecomunicaciones, Centro de Datos, Ascensores o sistemas que cuentan con equipos y/o tarjetas electrónicas, se considera que el valor máximo de la resistencia de un nuevo Pozo a Tierra debe ser de 5 ohmios.

5.- Debido a las continuas incidencias presentadas en algunos ascensores y el riesgo de una descarga eléctrica que pueda producir electrocución a las personas y presentar serios daños a los dispositivos o tarjetas electrónicas, se sugiere que cada ascensor debe tener un sistema de puesta a tierra exclusivo, según el reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), para prevenir riesgos eléctricos y garantizar la seguridad a los usuarios y la estabilidad del sistema ante descargas eléctricas.

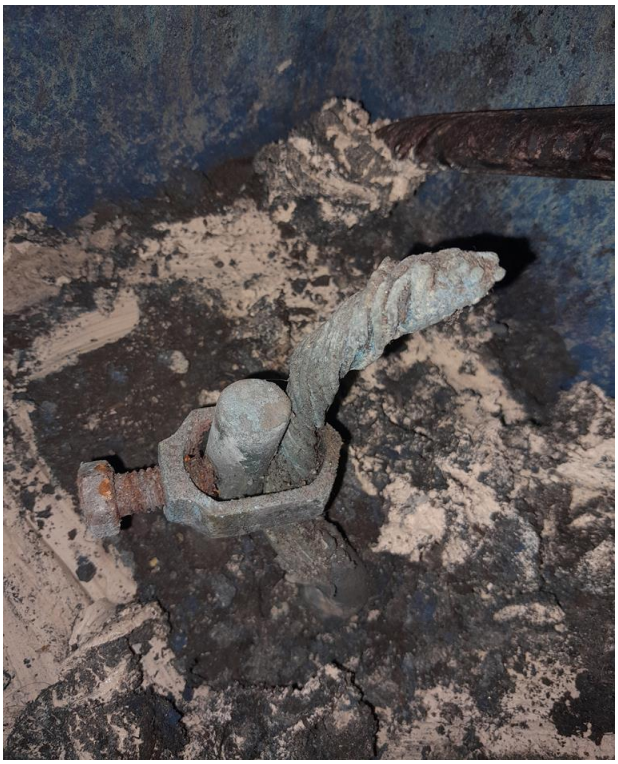



Sin otro particular y a la espera de sus gratas órdenes quedamos de ustedes,
Muy atentamente

RSOLUCIONES TECNOLÓGICAS E INFRAESTRUCTURA E.I.R.L.
ING. ROLANDO SALHUANA
Gerente General


JR. PRESBÍTERO GARCÍA VILLÓN 671 - CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA
E-MAIL: RSOLUCIONESTECNOLOGICAS@GMAIL.COM / WHATSAPP: 943 834 656


## SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

**¿Porqué instalar un Sistema de Puesta a Tierra?**


Se debe instalar un sistema de puesta a tierra porque ante una descarga atmosférica o un corto circuito, sin tierra física, las personas estarían expuestas a una descarga eléctrica, los equipos tendrían errores en su funcionamiento. Si las corrientes de falla no tienen un camino para disiparse, por medio de un sistema de conexión correctamente diseñado, entonces éstas encontrarían caminos no intencionados que podrían incluir a las personas.

1. Seguridad Humana
2. Seguridad de los Equipos eléctricos ó electrónicos
3. Buen funcionamiento de los equipos




© OTIC - Ministerio de Educación 2015 

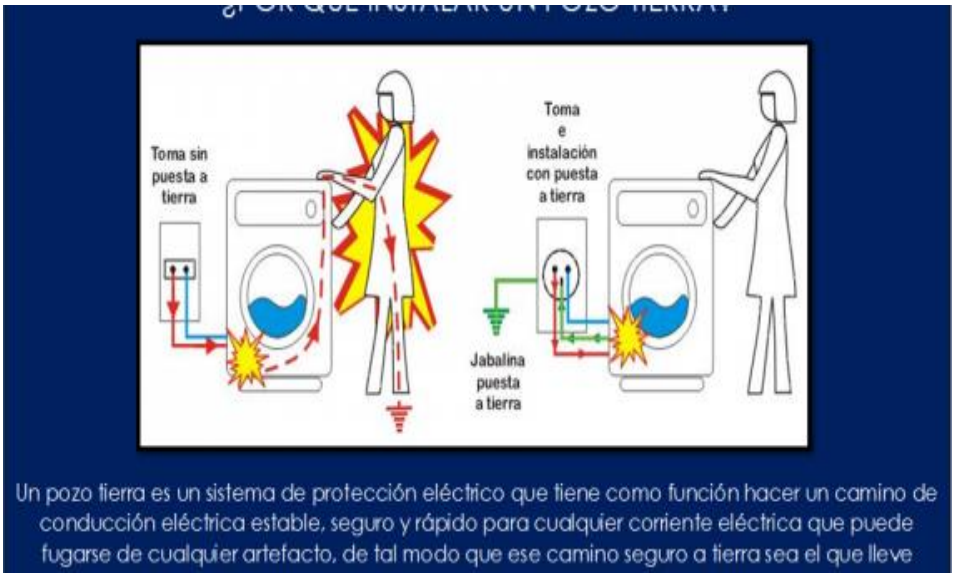


Un pozo tierra es un sistema de protección eléctrico que tiene como función hacer un camino de conducción eléctrica estable, seguro y rápido para cualquier corriente eléctrica que puede fugarse de cualquier artefacto, de tal modo que ese camino seguro a tierra sea el que lleve

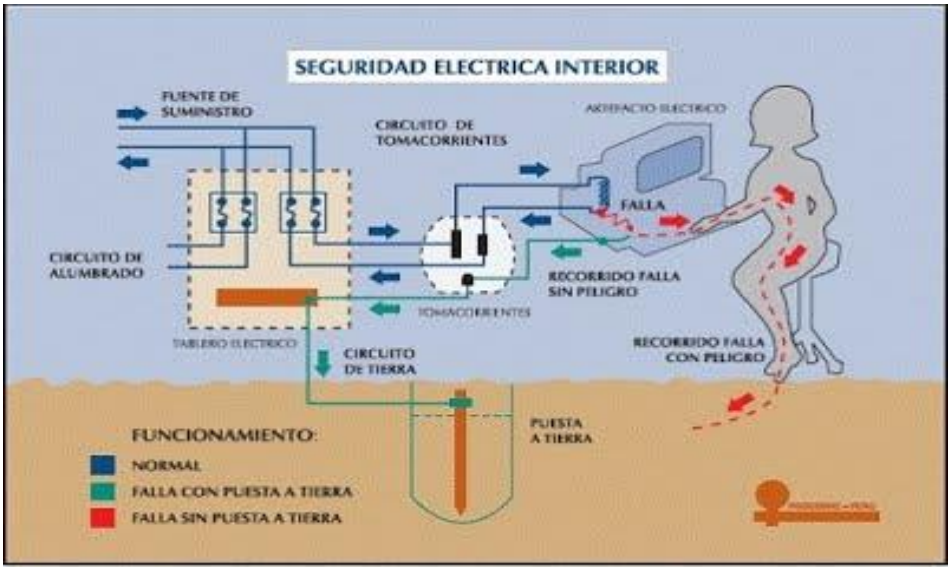

BCP

# TRANSFERENCIA A TERCEROS BCP

Monto transferido

## S/ 1,911.60

Jueves, 30 abril 2026 - 7:23 p. m.

| | |
|---|---|
| Enviar a | **Yataco Palomino Ana Maria**<br>**** 3099<br>Moneda soles |
| Banco destino | **BCP** |
| Desde | **CUENTA CORRIENTE**<br>**** 3015 |
| Canal | **Banca por internet BCP** |
| Número de operación | **06210384** |
